



RAPORT POSTĘPU PRAC

1. Trwają prace demontażowe.






2. Kucie posadzki wewnątrz obiektu- skuty materiał wywieziony do miejsca składowania w celu przekruszenia.



3. Trwają prace rozbiórkowe ścian, sufitów podwieszanych. Antresola przygotowywana do skucia stropu.



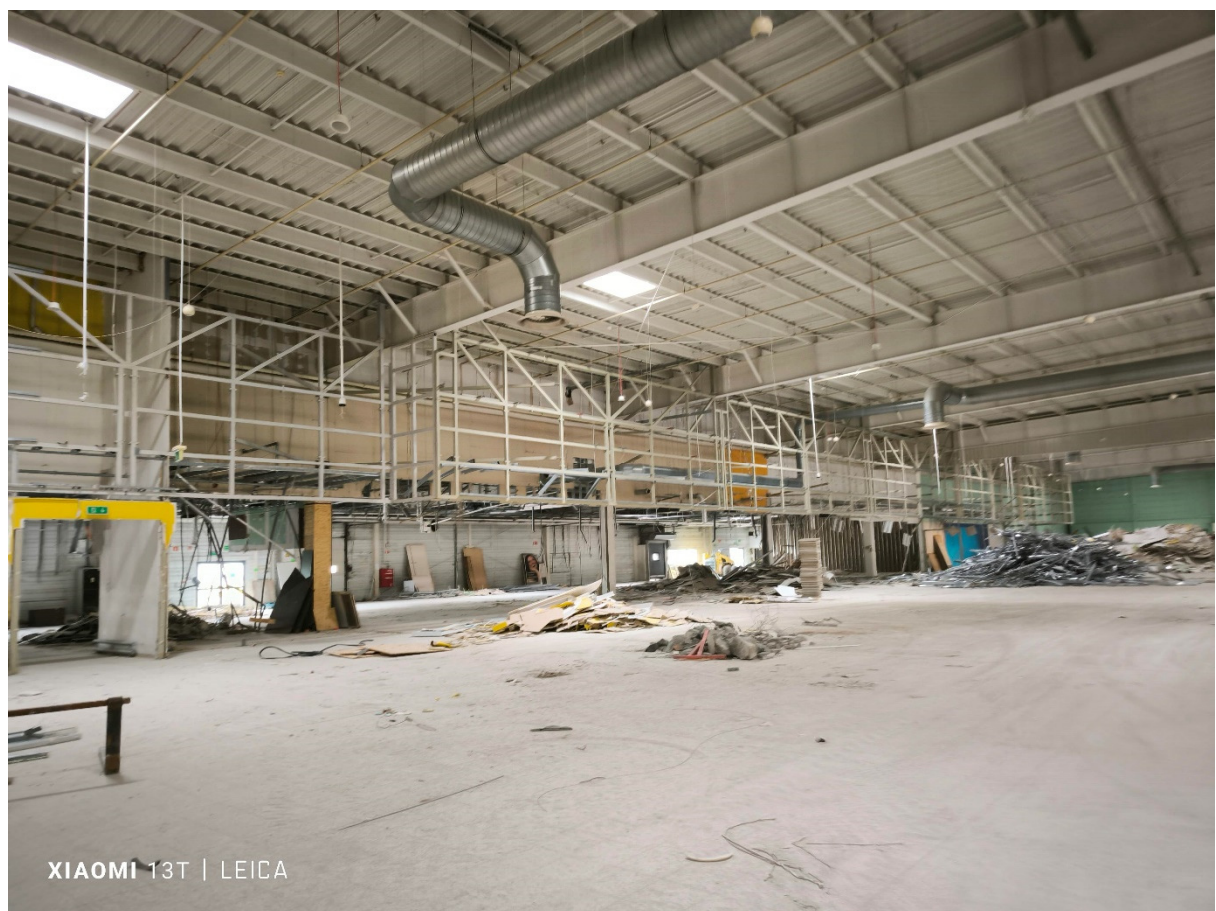

PLAN NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ:

1. Końcówka tygodnia rozpoczniemy prace związane z siecią wodociągowa na parkingu głównym z przodu.
2. Demontaż konstrukcji stalowej.
3. Frezowanie asfaltu parking główny
4. Kontynuacja demontażu poszycia dachowego
5. Rozpoczniemy montaż nowego poszycia.
6. Demontaże instalacji elektrycznych i sanitarnych kontynuacja.
7. Rozbiórki kontynuacja.
