



RAPORT POSTĘPU PRAC nr 3

1. Trwają prace demontażowe na dachu.







2. Kucie posadzki wewnątrz obiektu- skuty materiał wywieziony do miejsca składowania w celu przekruszenia. Strop na antresoli w większości skuty.



3. Trwają prace rozbiórkowe ścian GK, sufitów podwieszanych, oraz pozostałości instalacji.

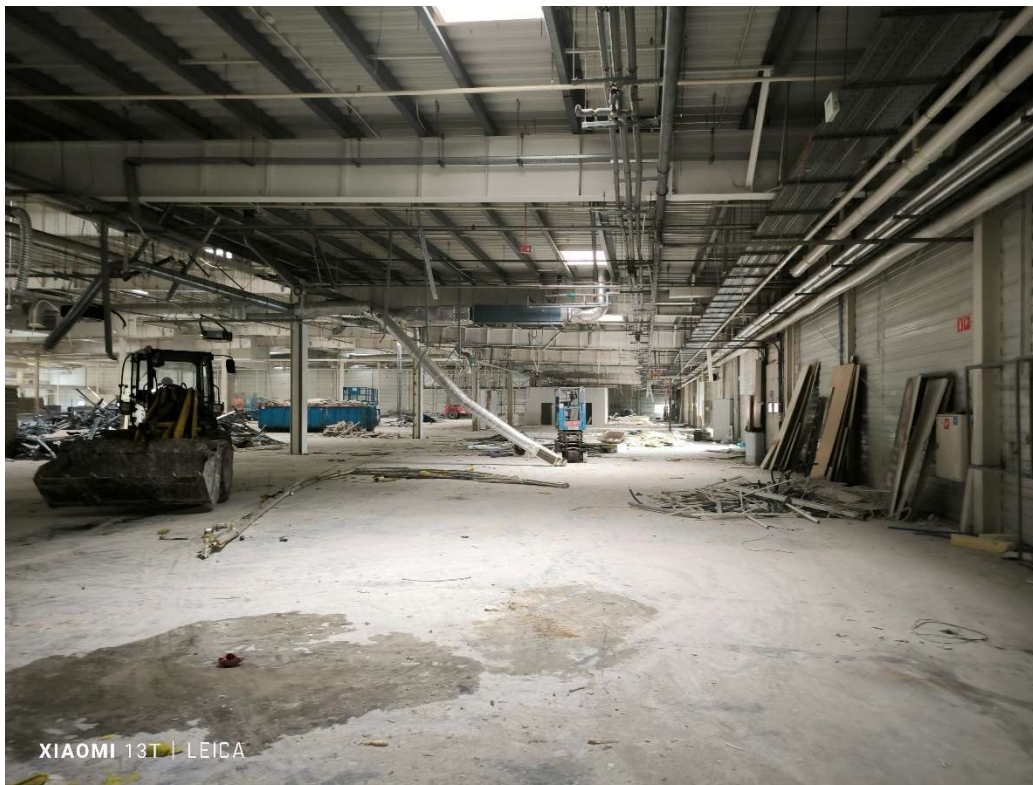

4. Wykopy pod nowe fundamenty.

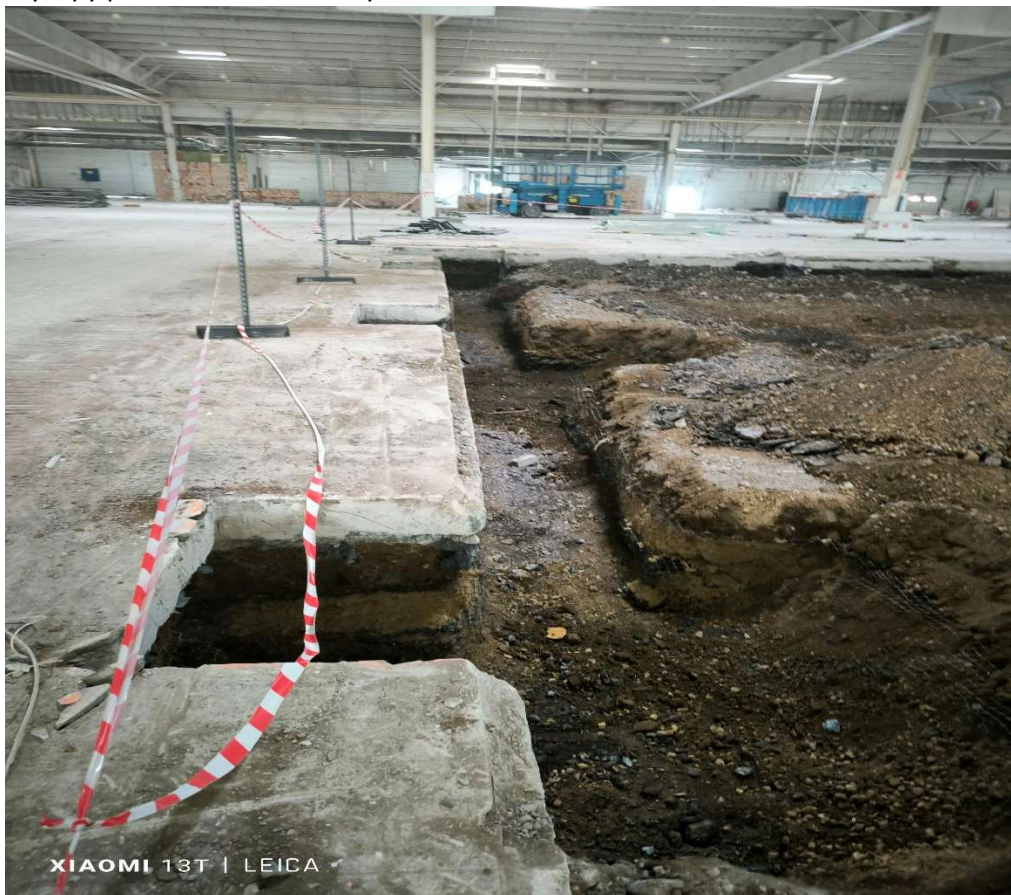



XIAOMI 13T | LEICA

5. Frezowanie asfaltu na parkingu głównym.





PLAN NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ:

1. Kontynuacja prac związanych z siecią wodociągowa na parkingu głównym z przodu.
2. Demontaż konstrukcji stalowej kontynuacja.
3. Kontynuacja wykopów pod nowe fundamenty.
4. Kontynuacja demontażu poszycia dachowego
5. Rozpoczniemy montaż nowego poszycia.
6. Demontaże instalacji elektrycznych i sanitarnych kontynuacja.
7. Rozbiórki kontynuacja.
8. Zdejmowania starych Rooftopów z dachu.

Link do większej paczki zdjęć, oraz filmiku z przelotu dronem:

<https://daldehogcloud.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=72ce51124c50481f8cea3132b1ff60c3>
